

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Εφαρμογών

Δ/ση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 03/06/2021

Αρ. Πρωτ.: 6875

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1^η έως 31^η Μαΐου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το μήνα Μάιο 2021.

Γενικά

Ο μήνας έκλεισε με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αφού τα γραφεία της ΕΔΥΤΕ επελέγησαν για την πρώτη δημόσια παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Πιστοποιητικού για τον Κορονοϊό. Η παρουσίαση έγινε από τον Υπουργό ΨηΔ κ. Κ. Πιερρακάκη, από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σ. Μισέλ και από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μ. Σχοινά. Η επιλογή της ΕΔΥΤΕ για την παρουσίαση αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της ως τεχνολογικού φορέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η αναγνώριση αυτή, με τη σειρά της, ανεβάζει τον πήχη των καθηκόντων, αλλά και ενισχύει το θετικό κλίμα και τη δημιουργικότητα μέσα στον οργανισμό.

GOV.GR και λοιπές σχετικές εφαρμογές

Το μήνα Μάιο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη πραγματοποιήθηκε ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών, όπου είναι πλέον διαθέσιμες πάνω από 1.160 υπηρεσίες. Ο μήνας ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις και θυρίδες του gov.gr. Πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του EU Digital COVID Certificate, ήτοι του Digital Green Pass όπως αρχικώς λεγόταν, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχοντας ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας την 1^η Ιουνίου (βλ. επίσης προηγούμενη αναφορά για τη σχετική παρουσίαση). Νωρίτερα, τέθηκαν σε παραγωγή τόσο οι βεβαιώσεις αρνητικού-θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, όσο και οι αιτήσεις για τηλεοπτική κάλυψη σε λευκές περιοχές. Ακόμη, υποστηρίχθηκε παραγωγικά και αναβαθμίστηκε η πλατφόρμα (και η αντίστοιχη υποδομή) για τα self tests εκπαιδευτικών και μαθητών, από όπου εξυπηρετούνται άνω των 1,5 εκατομμύριο πολιτών (εκπαιδευτικοί, μαθητές). Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε επίπεδο demo η έκδοση Αποσπάσματος Ψηφιακού Απολυτηρίου,

1/16

όπου έχουν αναπτυχθεί 3 πρότυπα, καθώς και νέα πρότυπα αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ για δημοφιλή πιστοποιητικά, ενώ προχωράμε επιμέρους εργασίες (π.χ. αυθεντικοποίηση στην επερχόμενη mobile εφαρμογή της υγείας, αιτήσεις ΕΜΥ, κ.λπ.).

εΚΕΠ

Κατατέθηκε η πρόταση για την ένταξη του έργου και ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης του.

Από το οικοσύστημα ΕΜΔ-Δίαυλος και συναφή

Επιτυχείς κρίνονται όλοι οι κύκλοι εκπαίδευσης για τα στελέχη που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την σύνταξη διαδικασιών στο ΕΜΔ-Δίαυλος. Τα στοιχεία στο <https://reg-diaavlos.gov.gr/> στις 31 Μαΐου ήταν: 2768 τιτλοποιημένες διαδικασίες, 155 προς δημοσίευση, 612 δημοσιευμένες.

Στον κατωτέρω πίνακα οι δημοσιευμένες ανά Υπουργείο:

Φορέας	Δημοσιευμένες	Δημοσιευμένες EU-GO
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	8	6
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	57	27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	56	45
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	41	1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	43	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	11	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	32	14
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	6	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	17	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	64	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	27	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	12	2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	6	5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	41	17
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	124	16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	6	0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	38	1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	11	8
ΣΥΝΟΛΟ	612	142

Έχει ολοκληρωθεί η αγγλική έκδοση του wiki ώστε το <https://reg-diavlos.gov.gr/> να μπορεί να υποδεχτεί διαδικασίες στην αγγλική, ενώ την ίδια στιγμή η λειτουργική έκδοση στα ελληνικά του euگو είναι έτοιμη προς παράδοση.

Αξίζει να αναφερθεί η ανάδειξη του έργου ως καλή πρακτική για τον κατάλογο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://joinup.ec.europa.eu/collection/catalogue-services/news/success-story-testimonial-greece>).

Άμεσα, και αφού ενσωματωθούν ορισμένες ελάχιστες παρατηρήσεις από την πλευρά του Υπουργείου, θα παραδοθεί και το ενημερωτικό μέρος του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας (1ο μνρ). Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας βρίσκονται υπό την εποπτεία του ίδιου του ΓΓ ΓΓΨΔΑΔ και των συνεργατών του.

Λοιπά σημαντικά

Σταδιακά αρχίζουν να εντάσσονται **νέα έργα** από τον κατάλογο των βραχυπρόθεσμων έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχημάτισμού, [εδώ](#), σε συνεννόηση με το Γραφείου Υπουργού. Στη φάση αυτή πραγματοποιείται μία προμελέτη με παραδοτέο μια περιορισμένη σύνοψη που να δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να παρθεί η απόφαση υλοποίησης ή μη.

Ξεκίνησε η υλοποίηση της εφαρμογής των **Αναπληρωτών Καθηγητών**. Με ελαχιστοποιημένα τουλάχιστον τα φανερά εμπόδια και με μια ομάδα που θα ενισχυθεί περαιτέρω, στόχος είναι να παραδοθεί το 1ο μνρ στις 30/7/2021.

Ακόμη, συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2η φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον προτεινόμενο **Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub** για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, όπου πλέον υπάρχει μία πρώτη αποτύπωση του προσχεδίου της πρότασης, έχοντας προς ώρας δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαστασιολόγηση, την περιγραφή και τις υπηρεσίες κάθε πακέτου εργασίας.

Ακολουθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν το Μάιο

Οριζόντιες Δράσεις

ΨΔΟΡ04 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Διερεύνηση αλληλεπίδρασης μέσω REST API με το User Management module των WF engines
- Εξέταση pros-cons εναλλακτικής υλοποίησης updates ως asynchronous event notifications για οριζόντια κλιμάκωση.
- Διερεύνηση REST API των WF engines για επικοινωνίες με εξωτερικές εφαρμογές.
- Υλοποίηση δυνατοτήτων ταυτόχρονου deployment workflows και φορμών. (json, html)
- Συνεργασία με ομάδες ΕΜΔ, EUGO για αρχική υλοποίηση ΕΜΔ/registry διαδικασιών hosted σε server.
- Διερεύνηση γενίκευσης δυνατότητας δυναμικής δημιουργίας φορμών εντός και εκτός περιβάλλοντος WF engine.
- Συνέχιση ανάλυσης Local Sub-Registry.
- Διερεύνηση WF engine UI customization.

Επόμενα:

- CDC
- User Management
- Υποδομές Messaging
- Διαλειτουργικότητες με ΚΕΔ/ΓΓΠΣΔΔ ως external task services των WF engines

Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, συνολικά διαθέσιμες πάνω από 1.160 υπηρεσίες
- Υποστήριξη Παραγωγική Λειτουργίας
- Έναρξη εργασιών για ανασκόπηση και επικαιροποίηση του οδικού χάρτη 2021

Επόμενα:

- Επικαιροποίηση σχεδίου εργασιών και οδικού χάρτη 2021 της συνοπτικής αγγλικής έκδοσης
- Έναρξη εργασιών για επικαιροποίηση της αναλυτικότερης έκδοσης του οδικού χάρτη

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη των ακόλουθων τραπεζών
 - Τράπεζα Χανίων,
 - Τράπεζα Αττικής,
 - Τράπεζα Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Διερεύνηση της προσθήκης των τραπεζών στο mobile app

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και προσθήκη στην παραγωγή

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Εγκατάσταση της νέας έκδοσης (2.5) του κόμβου
- Υποστήριξη υπηρεσιών / δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών
- Έλεγχος και αλλαγές στις χώρες που είναι διαθέσιμες τόσο στον preproduction και στον production κόμβο.
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

Επόμενα:

- Προσθήκη της ΓΓΠΣ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο
- Ανάπτυξη μίας τεχνικής λύσης για την προσθήκη - διασύνδεση των Service Providers που είναι ήδη διασυνδεδεμένοι με την τρέχουσα έκδοση του κόμβου στη νέα έκδοση. Με αυτή τη λύση δεν θα χρειάζεται να γίνουν πολλές αλλαγές από τις υπηρεσίες για την μετάβαση τους στην νέα έκδοση.

- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΑΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

1. EU Digital COVID Certificate (a.k.a. Digital Green Pass)

(Σε ανάπτυξη, deployed demo)

Έγιναν:

- Εγκατάσταση demo για την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού και επίδειξη στην πολιτική/ευρωπαϊκή ηγεσία
- Ανάπτυξη αιτήσεων για έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, αρνητικού τεστ ή ανάρρωσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα
- Ετοιμασία των απαραίτητων υποδομών
- Ανάπτυξη και εγκατάσταση της στατικής σελίδας <https://eudcc.gov.gr/>

Επόμενα:

- Live 01/06
- Ανάπτυξη για χρήστες χωρίς Taxis (πχ τουρίστες)

2. self-testing.gov.gr (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)

Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 και Σχολική κάρτα COVID-19, Διαλειτουργικότητες με ΗΔΙΚΑ

Έγιναν:

- Εργασίες αναβάθμισης/scaling της εφαρμογής και των υποδομών για την υποστήριξη ~1.5εκ. χρηστών
- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, συνεχής ενημέρωση της στατικής σελίδας και παρακολούθηση

3. Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Ανάπτυξη προτύπων και παραγωγική λειτουργία 14/05 (βεβαιώσεις αποτελέσματος)

Επόμενα:

- Ανάπτυξη για πολίτες με ειδικό ΑΜΚΑ ή/και για χρήστες χωρίς Login taxis

4. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Λήψη επιχειρησιακού feedback και ενημέρωση των προτύπων για Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές από πολίτη και από ΚΕΠ
- Παραγωγική λειτουργία 19/05

- Διορθώσεις και Εξαγωγή στατιστικών αιτήσεων

5. Έκδοση Αποσπάσματος Ψηφιακού Απολυτηρίου (Deployed demo)

Έγιναν:

- Εγκατάσταση demo 4 προτύπων για Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ
- Εκτεταμένες Δοκιμές σε περιβάλλον ανάπτυξης
- Προετοιμασία για παραγωγική λειτουργία

6. Αιτήσεις προς τις θυρίδες των ΚΕΠ

Προσθήκη προτύπων αιτήσεων στο <https://ekep.services.gov.gr/> (demo deployed)

Έγιναν: Εγκατάσταση demo 5 νέων προτύπων αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ

- 1. Πιστοποιητικό Γέννησης
- 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- 3. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
- 4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
- 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Επόμενα:

- Λήψη feedback από επιχειρησιακό υπεύθυνο και παραγωγική λειτουργία

Άλλες εργασίες:

- Ανάπτυξη και εγκατάσταση demo για
 - Αίτηση και θυρίδα για έκδοση Πιστοποιητικών ΕΜΥ
 - διορθώσεις για την Αίτηση Ποινικού Μητρώου
 - παροχή ταυτοποίησης gov.gr για την πλατφόρμα ehealth.gov.gr (oidc)
- Ανάπτυξη για Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

1. [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
2. [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
3. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
4. [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας](#)
5. [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
6. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
7. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
8. [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
9. Πιστολ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))

10. [Θυρίδα πολίτη](#)
11. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
12. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
13. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
14. [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
15. [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
16. [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
17. [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές](#) (και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Green Pass (deployed demo)
2. 5 νέα πρότυπα αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ (deployed demo)
3. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)
4. Ψηφιακά Απολυτήρια (deployed demo)
5. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
6. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(υπο ανάπτυξη)
7. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπο ανάπτυξη)
8. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
10. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
11. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER-KYC (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Έγιναν:

- 5 Φορείς σε παραγωγική λειτουργία - 19 αιτήσεις για ένταξη νέων ΠΙ-ΧΟ
- Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας - Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών
- Αυτοματοποίηση καταχώρισης των στατιστικών
- 90.785 συναλλαγές-εγκρίσεις πολιτών για διαβίβαση στοιχείων / 66.899 διαφορετικά ΑΦΜ
- Επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης για σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής egoc-KY
- Εισήγηση για οριστική παραλαβή του έργου KYC

- Παρουσίαση της εφαρμογής και της διαδικασίας ένταξης σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
- Αναβάθμιση της εφαρμογής - Εμφάνιση μόνο των επιλεγμένων κατηγοριών στο “Δείτε τα στοιχεία σας”.
- Επεξεργασία πρότασης για σχεδίαση και υλοποίηση έργου egon-KYC για παρόχους κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης

Επόμενα:

- Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.
- Εκπαίδευση τεχνικών από τον ανάδοχο.
- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egon-KYC
- Αναβάθμιση έργου egon-KYC

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ) (Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 17/3)

Έγιναν:

- Παραλαβή νέου επικαιροποιημένου αρχείου ταχυδρομικών θυρίδων από ΕΛΤΑ.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών.
- Troubleshooting αποστολών SMS σε κινητά εξωτερικού.

Επόμενα:

- Σε εξέλιξη ο μηχανισμός των ειδοποιήσεων με κινητά με την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΕΜΕπ.
- Αυτοματοποίηση καταχώρισης των στατιστικών.
- Αποστολή επιστολής στους Φορείς που χρησιμοποιούν στοιχεία επικοινωνίας πολιτών για αξιοποίηση στοιχείων ΕΜΕπ.
- Ενίσχυση της δράσης ως προς παροχή υπηρεσίας ενημερώσεων/ ειδοποιήσεων (Notification Center) στους φορείς του δημοσίου για αποστολή μαζικών ή και ατομικών ειδοποιήσεων σε πολίτες.
- Συνεργασία με ΑΑΔΕ για αξιοποίηση ΕΜΕΠ στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν:

- Υλοποίηση υποδομής για επισκόπηση, εισαγωγή και διαγραφή σημείων ενδιαφέροντος και σημείων.

- Ενσωμάτωση WMS κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ
- Ολοκλήρωση λειτουργίας εισαγωγής και διαγραφής σημείων ενδιαφέροντος και Διευθύνσεων.

Επόμενα:

- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Οργανωτικά θέματα συντονισμού.
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών
- Επικοινωνία με ΚΕΔΕ

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Συνέχιση και παρακολούθηση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one pager
- Ανασκόπηση εκκρεμοτήτων, αναλυτικός προγραμματισμός επόμενων εργασιών, αποστολή σχετικού υπομνήματος σε Επιτροπή Παραλαβής
- Αντιστοίχιση πεδίων και συνάντηση για διαλειτουργικότητα με ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου εκπαίδευσης και εκκίνηση δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης συντακτών ΕΜΔ
- Συγκρότηση ομάδας Συντονιστών επιμορφωτών με σκοπό τον συντονισμό τους.
- Τετάρτη συνεδρία ανάδρασης με πρώτο γκρουπ επιμορφωτών. Ανάδραση από την εκκίνηση του Α' κύκλου
- Τεχνικές εργασίες
 - αγγλικό wiki
 - Βελτιώσεις στην αυτόματη παραγωγή και εμφάνιση BPMN διαγραμμάτων-2
 - Επιλογή/αποεπιλογή πεδίων βάσει συνθηκών (ολοκλήρωση)
 - Δυνατότητα αλλαγής διαχειριστή σε διαδικασία (ολοκληρώθηκε- EUGO)
 - Δυνατότητα αποεπιλογής επιλεγμένης διαδικασίας gov.gr
- Κατασκευή dashboard για επόπτες με στατιστικά στοιχεία
- Αλλαγές στην εμφάνιση των διαδικασιών. (εμφανίζονται πλέον ως επιλέξιμες μόνο οι δημοσιευμένες)

10/16

- Αλλαγές στην κεντρική δομή του «Με μια ματιά»
- Προσθήκη τιμών σε λεξικά του ΕΜΔ και προσθήκη νέων πεδίων (το πεδίο NACE έγινε πολλαπλών επιλογών)
- Εμπλουτισμός και βελτίωση των κειμένων βοήθειας του Δίαυλος
- Βελτιώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Ενημέρωση φορέων από απογραφή και μετάφραση όλων των φορέων στα αγγλικά.

Επόμενα:

- Βελτιώσεις στην εμφάνιση των διαδικασιών στους πολίτες 30.6
- Βελτιώσεις στα dashboards ρόλων (15.6.21)
- Ανάπτυξη ρόλου Επιμελητή (8.6.21)
- Εκκίνηση αγγλόφωνου ΕΜΔ (Υλοποίηση Α φάσης). (31.5)
- Αποσφαλμάτωση στο αγγλικό ΕΜΔ
- Βελτιώσεις στη δομή ανάπτυξης του έργου, βάσει προτάσεων της αντίστοιχης ομάδας της ΕΔΥΤΕ (Μιχαήλ, Βαρλάμης)
- Έλεγχος των δημοσιευμένων διαδικασιών (630)
 Ο ως προς την πληρότητα και ακρίβειά τους (ομάδες ΥΨΔ και ΕΔΥΤΕ)

[Εδώ ο Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Συγγραφή των μαθημάτων για myKEPlive, Θυρίδας ΚΕΠ
 - Συγγραφή και review του μαθήματος ΕΜΕΠ
 - Συγγραφή review και επικαιροποίηση των μαθημάτων για τα πιστοποιητικά
 - Επικαιροποίηση των μαθημάτων Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
 - Συγγραφή του μαθήματος ΚΥC, 20%
 - Συγγραφή του μαθήματος για άδειες αυτοκινήτων, 20%
 - Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 10%
 - Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, 1ος και 2ος κύκλος.
- Συντονισμός συντονιστών επιμορφωτών
- Προετοιμασία για αναβάθμιση του Moodle, παραγωγικού server



Επόμενα:

- Συγγραφή για τα μαθήματα για τις άδειες οδήγησης, ΚΥC
- Συγγραφή του μαθήματος Ψηφιακής υπογραφής
- Αντικατάσταση στατιστικών με Μαΐου
- Review των μαθημάτων για myKEPlive, Θυρίδας ΚΕΠ
- Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, 3ος και 4ος κύκλος.

11/16

Συντονισμός συντονιστών επιμορφωτών

- Επικαιροποίηση του μαθήματος των πιστοποιητικών
- Σχέδιο μαθήματος και συγγραφή για το μάθημα euo
- Αναβάθμιση του Moodle, παραγωγικού server

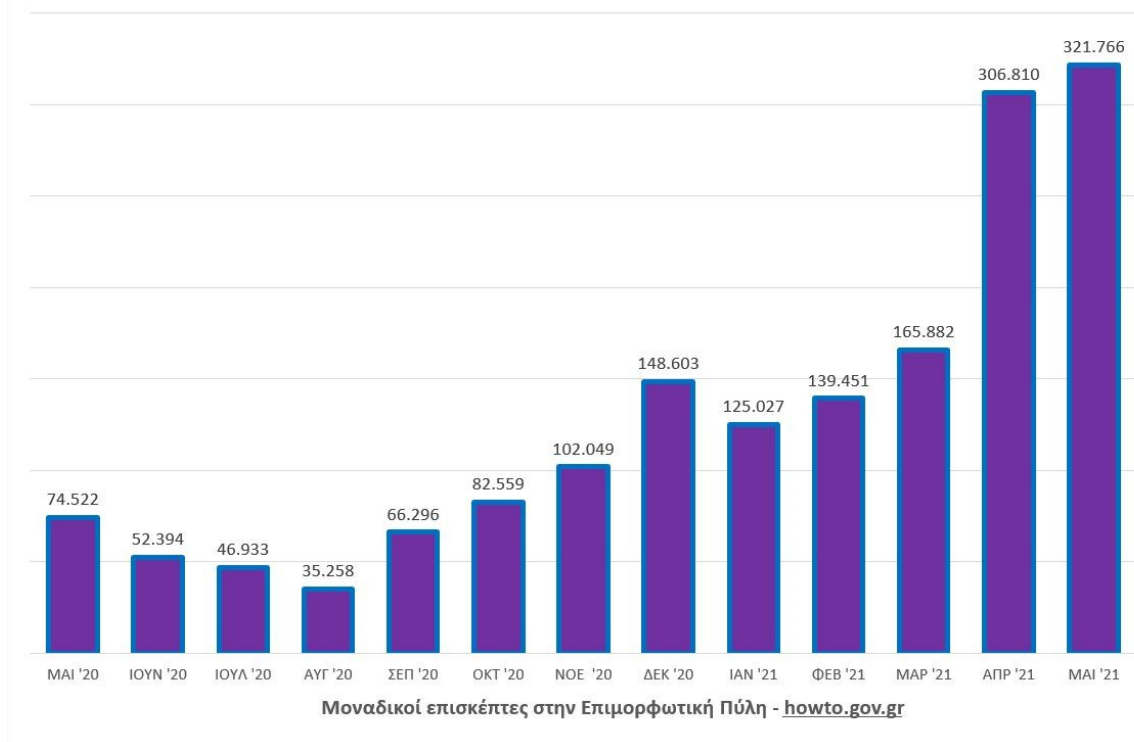

ΨΔ42 eugo

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση 1ου mnp
- Εγκατάσταση σε παραγωγικό server ελληνικής έκδοσης

Επόμενα:

- Εκπαίδευση συνεργατών από το Υπουργείο για επεξεργασία και ανάρτηση πληροφοριακού περιεχομένου
- Ολοκλήρωση αγγλικής έκδοσης και έναρξη εισαγωγής διαδικασιών του eugo στην αγγλική γλώσσα.

ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Έγιναν:

- Έναρξη υλοποίησης
 - συγκρότηση ομάδας 1^ο sprint
 - αναθέσεις εργασιών
 - 1^η συνεδρίαση Επιτροπής Εποπτείας

Επόμενα:

- Επίλυση όλων διαλειτουργικοτήτων και υλοποίηση βασικών (b-glossa, myschool, κ.λπ.)

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Έγιναν:

- Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
- Σχεδιασμός Οδικού Χάρτη - Χρονοδιαγράμματος
- Συγκρότηση ομάδων εργασίας
- Καταμερισμός και προετοιμασία οδηγιών προς υπεύθυνων πακέτων εργασίας

Επόμενα:

- Προετοιμασία συνάντησης με στρατηγικούς συνεργάτες
- Έναρξης συγγραφής πρότασης Β φάσης
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr

ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)

Έγιναν:

- Εξέλιξη μελέτης [σύνδεσμος εδώ](#)
- Στο πλαίσιο αυτό κύκλος συναντήσεων με υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων Υπουργείων. Μέχρι στιγμής:
 - Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης

Επόμενα:

- Συνέχιση μελέτης
- Συναντήσεις με
 - Υπουργείο Πολιτισμού
 - ΑΑΔΕΕ
 - και τα υπόλοιπα Υπουργεία και φορείς
 - Οργάνωση techday για γεωχωρικά

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών - συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ

ΨΔ62. Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών

Έγιναν:

- Συνεννοήσεις με υψηλόβαθμο στέλεχος Πολιτικής Προστασίας για ορισμό εκπροσώπων εμπλεκομένων

Επόμενα:

- Μελέτη υπαρχόντων σχεδίων καταστροφών από Πολιτική Προστασία
- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ

Έγιναν:

- στάσιμο

Επόμενα:

- Αναμένονται διοικητικές ρυθμίσεις

ΨΔ57. μΚΕΠ - Αρχική Λειτουργικότητα Διαδικασιών Παρακολούθησης Αιτήσεων ΚΕΠ

- Η δράση ενσωματώθηκε στο έργο eKEP, του οποίου η έναρξη αναμένεται σύντομα.

ΨΔ83. Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Οχημάτων (ΣΕΣΟ)

Έγιναν:

- Μελέτη draft κειμένου Υπηρεσίας Πληροφορικής (ΥΠ) ΥΥΜ για το ΣΕΣΟ.
- Συγγραφή αρχικής πρότασης/σχολίων/ερωτήσεων επί του draft κειμένου, αποστολή τους στην ΥΠ ΥΥΜ για ανατροφοδότηση. Δημιουργία προ-Σύνοψης, βασισμένη στο draft κείμενο της ΥΠ ΥΥΜ και της αρχικής πρότασης επί αυτού.

Επόμενα:

- Επικοινωνίες και συνεργασία ΥΠ ΥΥΜ - ΕΔΥΤΕ για το score/απαιτήσεις της ΥΠ ΥΥΜ για τη δράση.
- Ανάλυση και ενημέρωση Σύνοψης, βάσει score/απαιτήσεων της ΥΠ ΥΥΜ.

ΨΔ. Απλοποίηση Διαδικασιών Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου

Εγιναν:

- Προμελέτη.
- Δημιουργία προ-Σύνοψης.

Επόμενα:

- αναμονή οδηγιών από Γραφείο Υπουργού

Πίνακας νέων διαλειτουργικότητων

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνομία μεσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
